



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN JOSÉ DE LAS MATAS

INFORME RENDICIÓN DE
CUENTA PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO MUNICIPAL
ENERO – DICIEMBRE 2019

OBRAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2019

- ▶ Construcción de Casa Club del Grupo Scouts, Zona Urbana.
- ▶ Construcción Puente Arroyo la Vieja, Carrizal.
- ▶ Reparación de la Casa Club, Montones Abajo.
- ▶ Reparación de Club, Las Brujas.

NIVEL DE AVANCE CASA CLUB DEL GRUPO SCOUTS, ZONA URBANA PPM 2019

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
			X	TERMINADO

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 499,754.19	RD\$ 245.81

EVIDENCIAS CASA CLUB DEL GRUPO SCOUTS




EVIDENCIAS CASA CLUB DEL GRUPO SCOUTS



EVIDENCIAS CASA CLUB DEL GRUPO SCOUTS



EVIDENCIAS CASA CLUB DEL GRUPO SCOUTS

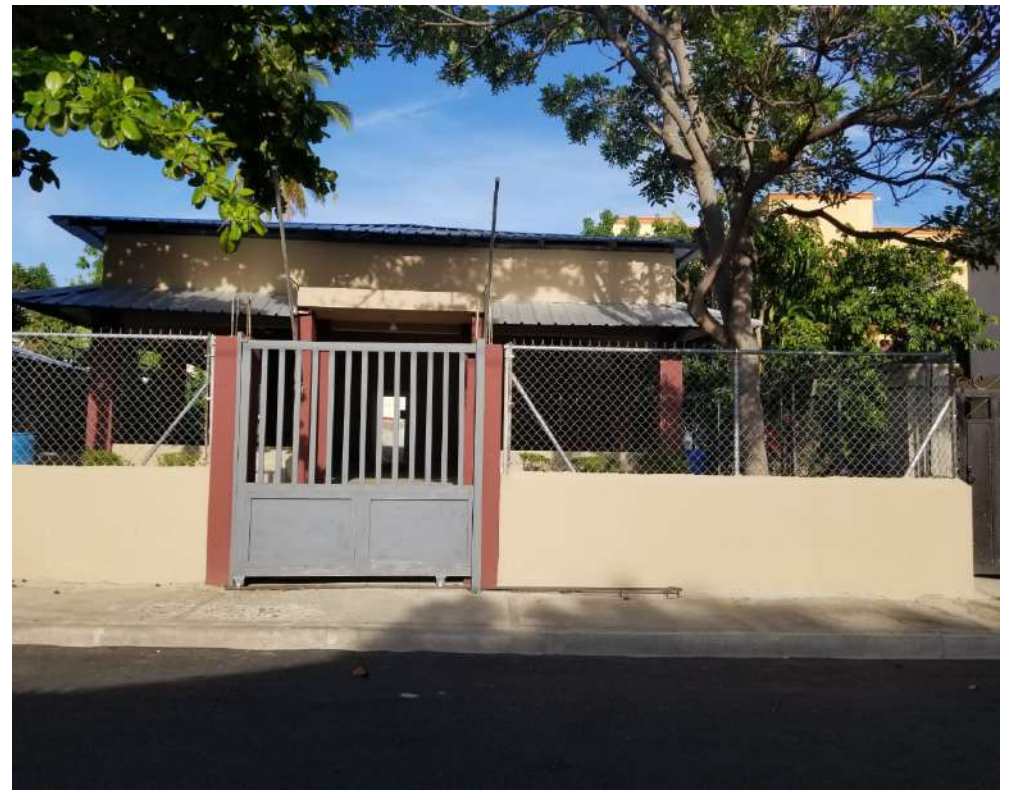

NIVEL DE AVANCE PUENTE ARROYO LA VIEJA, CARRIZAL PPM 2019

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
			X	TERMINADA

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 500,125.00	RD\$ -125.00

EVIDENCIAS PUENTE ARROYO LA VIEJA



EVIDENCIAS PUENTE ARROYO LA VIEJA



EVIDENCIAS PUENTE ARROYO LA VIEJA



EVIDENCIAS PUENTE ARROYO LA VIEJA



EVIDENCIAS PUENTE ARROYO LA VIEJA



PUENTE ARROYO LA VIEJA, CARRIZAL

Alcalde Roberto Espinal

NIVEL DE AVANCE CASA CLUB, MONTONES ABAJO PPM 2019

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
		X		EN PROCESO

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 422,350.06	RD\$ 77,649.94

EVIDENCIAS CASA CLUB, MONTONES ABAJO



EVIDENCIAS CASA CLUB, MONTONES ABAJO



EVIDENCIAS CASA CLUB, MONTONES ABAJO



EVIDENCIAS CASA CLUB, MONTONES ABAJO



NIVEL DE AVANCE CLUB, LAS BRUJAS PPM 2019

Nivel de Avance				Comentario
+/-40%	60%	80%	100%	
		X		EN PROCESO

Monto de la Obra	Ejecutado	Disponible
RD\$ 500,000.00	RD\$ 419,021.89	RD\$ 80,978.11

EVIDENCIAS CASA CLUB, LAS BRUJAS PPM 2019



NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS PPM 2019

Obras Programadas	Presupuesto Estimado	Nivel de Avance Presupuestario				Nivel de Avance en Ejecución Obras	Comentario
		+/-40%	60%	80%	100%		
Construcción de Casa Club del Grupo Scouts, Zona Urbana.	RD\$ 500,000.00				100%	100%	TERMINADA
Construcción Puente Arroyo la Vieja, Carrizal	RD\$ 500,000.00				100%	100%	TERMINADA
Reparación de la Casa Club, Montones Abajo.	RD\$ 500,000.00			84%		91%	EN PROCESO
Reparación de Club, Las Brujas	RD\$ 500,000.00			84%		85%	EN PROCESO

BALANCE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION PPM 2019

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje %
Obras ejecutadas	2	50%
Obras en proceso	2	50%
Obras pendientes	0	0%
TOTAL	4	100%

BALANCE DE EJECUCIÓN VOLUMEN FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA PPM 2019

Fondo de Disponibilidad Financiera	Monto de las Obras ejecutadas	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF	Porcentaje de Ejecución %
RD\$ 2,000,000.00	RD\$ 1,841,251.14	RD\$ 158,748.86	92%



Muchas
Gracias

ANÓNIMA LECTORA
